

PROSJEKTPLAN FOR STAD SKIPSTUNNEL



**Utarbeidet av prosjektgruppa for Stad skipstunnel
november 2015**

Versjon 18.11.15

Kontaktinformasjon:

Randi Paulsen Humborstad
Daglig leder Nordfjord Vekst
Prosjektleder for Stad skipstunnel
Mobil: +47 97 75 73 94
Mail: randi@nordfjordvekst.no |
Webside: www.nordfjordvekst.no www.skipstunnel.no
Besøks- og postadresse: Gate 1, nr 119, 6700 Måløy

1. ORGANISERING

Stad skipstunnel –

Ny prosjektorganisering vedtatt på styringsgruppemøte 05.11.15

Prosjekteier:

| |
|---|
| Selje kommune Vanylven kommune Vågsøy kommune |
|---|

Prosjektleder: Randi P. Humborstad, Nordfjord Vekst

Styringsgruppe:

| | |
|---|--|
| Rolf Domstein, leder Jenny Følling, fylkesordfører SFj. Nils P. Støyva, LO Jan Atle Stang, NHO Siri Hatland, Fraktefartøyenes rederiforening Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag Ottar Aare, Hurtigbåtforbundet Svein Gjelsest, Vanylven Stein Robert Osdal, ordfører Selje kommune Lena Landsverk Sande, ordfører Vanylven kommune Kristin Maurstad, ordfører Vågsøy kommune | Vara for styringsgruppe: Per Roar Gjerde, Marine Harvest Jon Aasen, fylkesordfører M&R Helge Haukeland, LO Nils Myklebust, SFj. fiskarlag |
|---|--|

Vara for styringsgruppe:

Prosjektgruppe:

| |
|---|
| Prosjektleder Randi Humborstad (Nordfjord Vekst) Ottar Nygård (tidligere ordfører i Selje kommune) Ottar Aare, direktør i Hurtigbåtforbundet |
|---|

Styringsgruppen har møter ca. 4 ganger i året.

Prosjektleder og Ottar Nygård har møterett i styringsgruppen.

2. PROSJEKTMÅL

2.1 Prosjektmål

Mål for prosjektet:

Prosjektgruppa for Stad skipstunnel sitt mål for prosjektet er å få realisert Stad skipstunnel som et nasjonalt prosjekt gjennom en særskilt statlig finansiering i Nasjonal transportplan. Videre målsetting er å bli prioritert i første fireårsperiode av NTP (2018-2027), og starte byggingen av Stad skipstunnel i 2018/2019.

2.2 Rammer

Tid:

Påvirkning inn mot beslutningstakere må være en kontinuerlig prosess frem til bygging av tunnelen er en realitet. Arbeidet må intensiveres i 2016 med sikte på rullering av Nasjonal transportplan i 2017.

Budsjettrammer:

Kr 600 000 i 2016. Se punkt 7.

Ressursbruk:

Ressursbruk for prosjektledelse vil bli avgrenset til ca. 40 % stilling i 2016.

3. BAKGRUNN

3.1 Historikk

Historien om en skipstunnel gjennom Stadlandet går langt tilbake i tid. I Vikingtida ble båtene dratt over Dragseidet i stedet for å seile rundt. Allerede i 1870-åra var det planer og skisser for bygging av Stad skipstunnel. Under siste verdenskrig hadde tyskerne seriøse planer om en skipstunnel, både pga vanskelige seilingsforhold og at båtene som gikk rundt Stad var lett bytte for fienden sine fly og ubåter. Men krigen tok slutt før prosjektet ble påbegynt.

I 1967 ble det publisert en artikkel i Handels- og Sjøfartstidende om farene ved Stadhavet og behovet for en skipstunnel.

I 1985 ble det utarbeidet et forprosjekt, og et selskap, dannet som et lutlag, jobbet som prosjekt- og interesseorganisasjon frem til en fikk løftet prosjektet opp på sentralpolitisk nivå. Dette selskapet jobbet med saken frem til det ble avløst av en politisk prosjektgruppe i 2006. Blant annet var det i 2006 sendt brev til Fiskeri- og kystministeren om utgreiing av stort tunnelalternativ.

Stad skipstunnel har til d.d. vært organisert av en prosjektgruppe bestående av kommunene Vanylven, Selje og Vågsøy (kom med i 2010) og fylkeskommunene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. I 2010 ble det bestemt at det fra hver kommune skulle sitte representanter fra næringslivet i prosjektgruppa. I tillegg har andre aktører deltatt ved behov. Selje kommune har hatt sekretariatsfunksjonen. Fram til høsten 2010 hadde Vanylven kommune en stilling på prosjektet. Høsten 2010 fikk Måløy Vekst prosjektlederansvaret for arrangering av konferanse.

Andre aktører som har deltatt i prosjektet er LO Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, NHO Sogn og Fjordane, Maritimt Forum Nordvest, Hurtigbåtenes Rederiforbund (HRF), Fraktestøtøyenes Rederiforening, Sogn og Fjordane fiskarlag og Norges Fiskarlag.

Våren 2012 ble det rigget en ny prosjektorganisering som sikrer en bredere forankring og fordeling av roller. Nordfjord Vekst stiller med prosjektleder. Prosjektgruppen består av prosjektleder Randi P. Humborstad, prosjektansvarlig, Ottar Nygård, ordfører i Selje, og Ottar J. Aare, Hurtigbåtenes Rederiforening. Stad skipstunnel er et nasjonalt prosjekt, noe som gjenspeiles i styringsgruppen, som er satt sammen av deltakere fra hele landet.

3.2. Fakta


Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket vi har langs norskekysten. Kombinasjonen av havstrømmer og undersjøisk topografi skaper spesielt komplekse og uventede bølgeforhold. Svært høye bølger opp til 33 meter kommer fra ulike kanter samtidig og skaper kritiske situasjoner. Forholdene innebærer også at tunge bølger kan henge igjen flere dager etter at vinden har stilnet, noe som igjen fører til vanskelige seilingsforhold selv på stille dager. Kråkenes fyr er den meteorologiske stasjonen i landet med flest stormdøgn, som kan variere fra 45 – 106 døgn pr år.

Dette har opp gjennom årene ført til en rekke skipsforlis med tap av menneskeliv og siden 2. verdenskrig har 34 mennesker mistet livet på Stadhavet. I 2003 var man nær en nasjonal katastrofe da hurtigruteskipet MS Midnatsol fikk motorstopp. MS Midnatsol var kun 100 meter fra land da ankrene til slutt fikk feste. Stad skipstunnel vil derfor bety mye for sikkerheten til sjøfarende og for tryggheten til pårørende. Prognoser om hyppigere ekstremvær og generell mindre aksept for risiko i samfunnet øker behovet for tunnelen ytterligere.

Dimensjonene på Stad skipstunnel, stort alternativ, er:


- Bredder 36 meter, 26,5 meter mellom fendrene
- Høyde fra bunn til topp 49 meter
- Dybde 12 meter (lavvann)
- Lengde 1700 meter

Pris for stort alternativ er beregnet til ca. 2 mrd. kr inkl. mva.

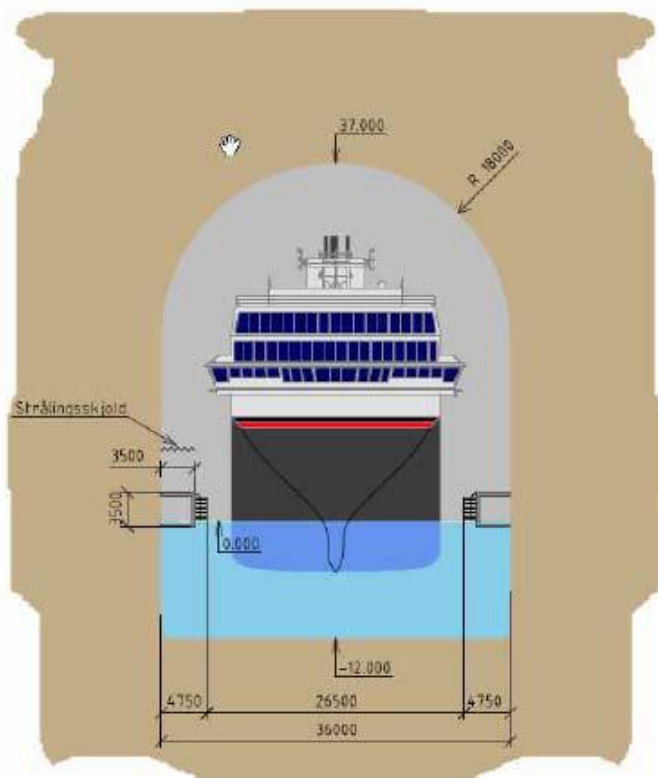

Figur: Tunneldimensjon tversnitt stor tunnel fra utredning 2007

Traseen for Stad skipstunnel går mellom Moldefjorden og Kjødepollen i Selje kommune, Sogn og Fjordane.

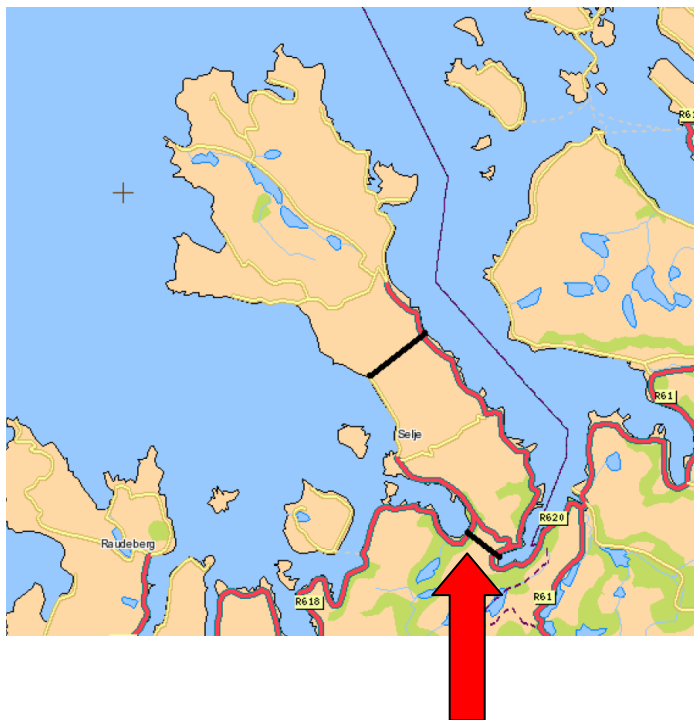

4. STATUS PROSJEKTET

4.1. Status samfunnsøkonomisk nytte

Stad skipstunnel har vært utredet i 18 rapporter.

Det ble gjennomført en omfattende forprosjektering i 2000-2001. En hovedrapport fra Kystverket i 2001 kom med positiv anbefaling. Kystverket gjennomførte i 2007 en konseptvalgutredning som konkluderte med at skipstunnelen vil gi samfunnsøkonomisk nytte.

Vinteren 2010 ble det bestemt av Kyst- og fiskeridepartementet at Stad skipstunnel skulle gjennom en ny konseptvalgutredning (KVU). Kystverket gjennomførte utredningen på oppdrag for departementet. Kystverket brukte eksterne konsulenter i selve utredningen, Det Norske Veritas og Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Konseptvalgutredningen ble lagt fram i januar 2011, og det ble konkludert med at Stad skipstunnel ikke bør bygges. Reverseringen i anbefalingen fra 2007 har blant annet sin forklaring i at både potensiell ventetid for skip ved Stad og risikoanalysen har blitt nedjustert. Ulempene/kostnadene ved tiltaket blir for høye i forhold til fordelene/nytten.

I etterkant av dette bestilte prosjektgruppen og arrangørene av en konferanse om Stad skipstunnel en gjennomgang av KVU'en fra SINTEF Bedriftsutvikling. Kortversjon av denne rapporten ble lagt fram på konferansen. Konklusjonen her er at det er overveiende sannsynlig at Stad skipstunnel vil ha positiv samfunnsøkonomisk nytte. Rapporten gir et anslag på over 1,2 mrd NOK i positiv samfunnsøkonomisk nytte. Endelig rapport var ferdig i midten av februar 2011.

Konseptvalgutredningen gikk sommeren og høsten 2011 gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1). Holte Consulting og Econ Pöyry utførte arbeidet, som ble levert til Fiskeri- og kystdepartementet i mars 2012. Bakgrunnen for utredningen er de spesielle seilingsforholdene rundt Stad. Hovedkonklusjonen er at analysene tyder på at netto nytteverdi er større enn det som kom fram i KVU'en. Konsulentene har kommet fram til at prosjektet, for å være samfunnsøkonomisk lønnsomt, må ha en nåverdi på ikke-prissette nytteeffekter på minst 390 millioner kroner for liten tunnel og minst 910 millioner kroner ved stor tunnel. Dette tilsvarer en fast årlig ikke-prissett nytteverdi på 25 millioner kroner for liten tunnel og 55 millioner kroner for stor tunnel.

SINTEF Bedriftsutvikling har våren 2012 i oppdrag fra prosjektgruppen sett på de ikke-prissatte nytteeffektene ved bygging av Stad skipstunnel, stor tunnel, og kommet frem til at antatt verdi av ikke-prissette konsekvenser i KS1 er mellom 75 og 100 millioner årlig.

Dette overstiger de 55 millioner som KS1 mener vil gi lønnsomhet gitt 4,5 % rente. Dermed er det overveiende sannsynlig at Stad skipstunnel vil ha positiv samfunnsøkonomisk netto nytte.

4.2 Aktivitet i prosjektgruppa

Prosjektgruppa hadde fra 2006 en rekke møter med sentrale aktører. Blant annet kom prosjektgruppen med innspill til KVU'en i 2007.

Prosjektgruppen bistod i oktober 2010 Kystverket og Det norske Veritas i arbeidet med KVVU'en for Stad skipstunnel. Det ble arrangert workshops i Ålesund og Måløy der næringslivet og andre interessenter kom med innspill.

I februar 2011 ble det arrangert en konferanse i Ålesund med prosjektgruppen som arrangør i samarbeid med LO Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, NHO Sogn og Fjordane og Maritimt Forum Nordvest. Til konferansen ble det laget en ny film om Stad skipstunnel, finansiert av sponsormidler. Filmen ble i mars 2011 revidert etter innspill og moment som kom fram under konferansen.

Det ble arrangert et miniseminar i Oslo i mai 2011, med ca. 60 deltakere.

I juni 2011 ble status for prosjektet lagt fram for Vestlandsrådet og fylkespolitikere i de fire vestlandsfylkene.

Prosjektgruppen har fulgt opp KS1-arbeidet og vært bindeledd mellom konsulentene som har utført KS1 og aktuelle aktører som har kommet med innspill.


I mars 2012 leverte Ottar J. Aare i Nordvest Fjordservice en *Kartlegging av ulykker, nestenulykker og hendelser på Stad* etter oppdrag fra Prosjektgruppen. Konklusjonen i denne kartleggingen er at det stadig skjer nestenulykker og uønskede hendelser som viser at potensialet for store ulykker på Stad er økende, samtidig som den generelle aksepten for risiko i samfunnet blir senket. Dette vil føre til at vi i fremtiden vil få mer forsinkelser og kanselleringer ved seilas rundt Stad. Kartleggingen viser også at 33 mennesker mistet livet i ulykker på Stad i tidsrommet fra 1956 til 1984. Hendelser som da hurtigruteskipet Midnatsol i desember 2003 fikk motorstopp på Stad og nestenulykken med lasteskipet Molo Trader i 2011 viser at potensialet for ulykker fortsatt er stort.

Siden KS1-rapporten (mars 2012) på en del områder ikke hadde prissatt nytteverdien ved bygging av Stad skipstunnel, ga prosjektgruppen SINTEF Bedriftsutvikling i oppdrag å tallfeste disse ikke-prissatte nytteeffektene ved bygging av stor tunnel.

I mai 2012 ble rapporten til SINTEF Bedriftsutvikling lagt fram for sentrale beslutningstakere på bl.a. et frokostmøte for sentrale stortingspolitikere på Hotel Bristol. Det var ca. 40 deltakere på frokostmøtet.

Fiskerimessa i Trondheim (14-17.08.12)

Prosjektgruppen fikk laget ferdig en ny og oppdatert brosjyre til Fiskerimessa (Nor Fishing 2012) i Trondheim 14.-17. august. Prosjektgruppen fikk også bestilt en «oppblåsbar» portal etter modell av tunnelen, som stod ved inngangen til Sogn og Fjordane standen på messa. Portalen ble lagt merke til, og resulterte i mye god PR rundt Stad skipstunnel. Generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind, åpnet portalen og Fiskeri- og kystministeren besøkte portalen under messa. Sogn og Fjordane standen ble også kåret til den beste standen på Fiskerimessa, og den oppblåsbare Stad skipstunnel portalen gjorde sitt til at man vant denne kåringen.

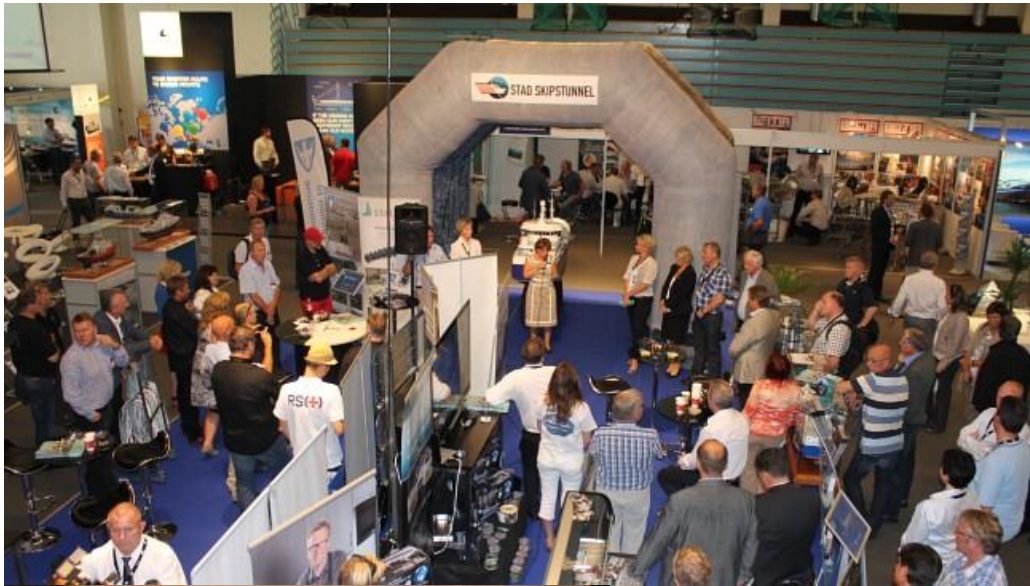

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen besøkte Stad skipstunnel-portalen på Fiskerimessa i Trondheim 14.-17. august-2012.

Fiskeri- og kystministeren la frem rapporten «Verdiskapning basert på produktive hav i 2050», fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)(2012). Denne rapporten spår en seksdobling av den norske sjømatnæringen og en omsetningsverdi på 550 milliarder i 2050 (90 mrd. i dag). En slik formidabel vekst vil by på mange utfordringer, ikke minst innen for infrastruktur og transport. Det vil føre til økt skipstrafikk over det utsatte Stadhavet, og dermed også styrke den samfunnsøkonomiske nytten av en skipstunnel. Prosjektgruppa ba derfor SINTEF Bedriftsutvikling regne på den samfunnsøkonomiske nytten hvis denne spådommen inntreffer. En seksdobling av fiskeri- og havbruksnæringen mot 2050 betyr snaut 4,5% vekst per år og vil bety en samfunnsøkonomisk nytte på mellom 1 og 2 mrd. for prosjektet Stad skipstunnel.


Nasjonal transportplan ble lagt frem 12.april-2013: Regjeringen gikk inn for å bygge skipstunnel på Stad og satt av 1 milliard kroner til prosjektet i andre periode (f.o.m. 2018).

I etterkant av NTP opplevde prosjektgruppa stor nasjonal og internasjonal interesse rundt prosjektet og så et behov for mer skriftlig informasjon om prosjektet. Prosjektgruppa fikk derfor laget en ny brosjyre om Stad skipstunnel på både norsk og engelsk. Brosjyren var ferdig i desember 2013.

Prosjektgruppa arrangerte en **Stad skipstunnel-konferanse 13.-14. november 2014** om bord i MS Nordlys fra Bergen til Ålesund. Konferansen ble en stor suksess med 88 deltagere, mange gode foredrag og konferansen fikk meget god mediedekning. Både VG, Aftenposten, NRK, Teknisk Ukeblad og Sunnmørsposten var med på konferansen. Prosjektgruppa lanserte også en ny Stad skipstunnel film på konferansen. Det var mange sentrale politikere og næringslivsfolk tilstede, og stor optimisme knyttet til realisering av Stad skipstunnel.

I Statsbudsjettet for 2014 ble det bevilget 5 millioner kroner til forundersøkelser (forstudie) for Stad skipstunnel. Kystverket skulle forbedre beslutningsgrunnlaget frem mot et forprosjekt om Stad skipstunnel, og overleverte forstudien til Samferdselsdepartementet i januar 2015. Forundersøkelsene var meget positive og departementet sendte bestilling på **forprosjekt og reguleringsplan til Kystverket i februar 2015.**

Som for prosjekter over 750 mill. kr så følger også Stad skipstunnel KS-regime mht utredning og kvalitetssikring av dette:

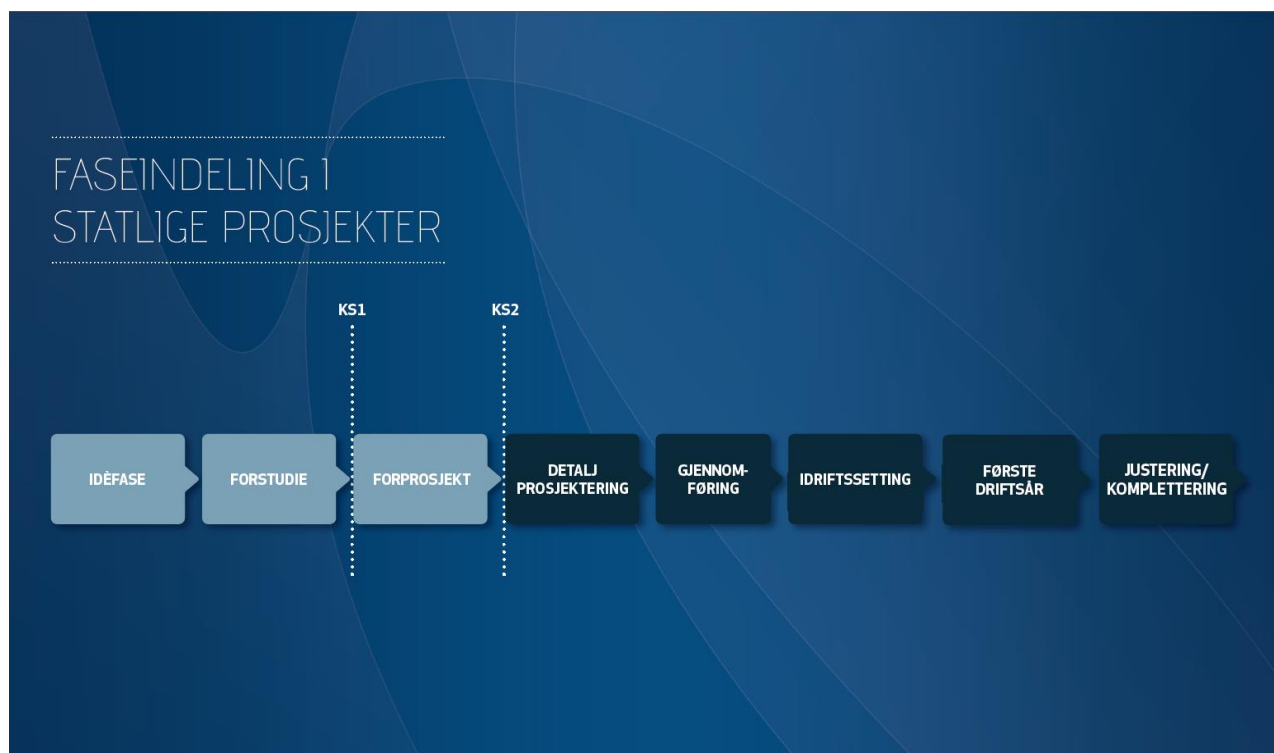



12. august 2015 besøkte samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen tunnelinnslaget til Stad skipstunnel i Moldefjorden og han uttalte da følgende: «Jeg mener at tidlig på 2020-tallet bør være en god målsetting for når tunnelen kan åpnes».

4.3 Sentrale møter 2012-2015

2012

- Møte m/NHOs adm. dir. John G. Bernander (23.05.12)
- **Møte m/finansminister Sigbjørn Johnsen og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (13.06.12)**
- Møte m/KrF-leder Knut Arild Hareide (13.06.12)
- Møte m/ sentrale Høyre-politikere på Stortinget (13.06.12)
- Møte m/LO-ledelsen (13.06.12)
- Møte med miljøvernminister Bård Vegard Solhjell (07.07.12)
- Fiskerimessa i Trondheim (14. - 17.08.12): Møte med fiskeriministeren Lisbeth Berg-Hansen og generalsekretær i Redningssekskapet, Rikke Lind
- Presentasjon for Næringsforum Vest (06.09.12)
- Presentasjon av prosjektet for Transport- og kommunikasjonskomiteen (11.09.12)
- Møte m/kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (21.09.12)
- **Transport- og logistikkmesse (22.-23. 10.12):** Prosjektgruppa i samarbeid med Nordfjord Hamn deltok med den «oppblåsbare» portalen etter modell av Stad skipstunnel på Transport- og logistikkmesse på Gardermoen. Samferdselsminister Marit Arnstad, Høyre-leder Erna Solberg og KrF-leder Knut Arild Hareide deltok bl.a. på konferansen.
- Presentasjon for SV sin representant i næringskomiteen, Alf Holmelid (02.11.12)
- Ny pol. rådgiver i FKD, Tord Dale, til Måløy (15.11.12)

2013

- Møte med AP sin fraksjon i næringskomiteen og transportkomiteen (17.01.13)
- Møte med LO-lederen Roar Flåthen (24.01.13)
- Presentasjon for samferdselsminister Marit Arnstad og kommunal – og regionalminister Liv Signe Navarsete på SP sitt samferdselspolitiske seminar, Førde (28.01.13)

- Innspillskonferanse om nærskipfart, Fiskeri- og kystminister, Oslo (11.02.13)
- TEKNAS årsmøte med tema: Stad skipstunnel, Selje hotell (08.03.13)
- Møte med samferdselspol. talsmann FrP, Bård Hoksrud og stortingsrepresentant Harald T. Nesvik, Ålesund (22.03.13)
- **Nasjonal Transportplan (12. april 2013)**
- Båttur til tunnelinnslaget i Moldefjorden samt besøk i simulatoren på Sikkerhetssenteret med Fiskeri- og kystminister (03.09.13)
- Presentasjon for Statens Vegvesen (06.09.13)
- Konferansen «Et nytt haveeventyr», Askvoll, møte med statssekretær i Fiskeridepartementet Amund Drønen Ringdal (05.11.13)
- **Møte med statssekretær i Samferdselsdepartementet, Jon Georg Dale (21.11.13)**

2014

- Presentasjon for regionsamling Kystverket Vest (23.01.14)
- Innlegg om Stad skipstunnel på Haugesundkonferansen (04.02.14)
- **Møte med Kystverket om bestillingen fra Samferdselsdepartementet (08.04.14)**
- **Innlegg på Kystverket sin brukerkonferanse (10.04.14)**
- Presentasjon for Samferdselsutvalget i Sogn og Fjordane på Selje hotell (25.06.14)
- Kystverket presenterte sitt arbeid med Stad skipstunnel på Selje hotell og vi hadde separat møte med de etter presentasjonen (03.09.14)
- Møte med stortingsrepresentant Bjørn Lødemel (H) på Stortinget (09.09.14)
- Møte med stortingsrepresentantene Abid Raja (V), Sveinung Rotevatn (V) og Oskar Grimstad (FrP) på Stortinget (10.09.14)
- **Møte med statssekretær i Samferdselsdepartementet, Jon Georg Dale (FrP) (23.09.14)**
- Møte med parlamentarisk leder i FrP, Harald T. Nesvik, på seminaret «Velg sjøvegen» i regi av Maritimt Forum nordvest, Ålesund (14.10.14)
- Transport- og logistikkmesse 20.-21. oktober 2014. Møte med sentrale politikere i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, ny statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen
- **Stad skipstunnel-konferansen 13.-14. november 2014 om bord i Hurtigruta.**
Foredragsholdere: LO-lederen, statssekretær Tom Cato Karlsen, stortingspolitiker Lisbeth Berg-Hansen, Liv-Signe Navarsete, etc. Paneldebatt med sentrale politikere fra Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
- **Møte med statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen (FrP), (24.11.14)**



Storingsrepresentantene Lisbeth Berg-Hansen (Ap), Liv Signe Navarsete (Sp), Sveinung Rotevatn (V), Helge Orten (H) og statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen (FrP), deltar i paneldebatten på Stad skipstunnel-konferansen om bord i Hurtigruta MS Nordlys 13.-14. november 2014. Konferanseleder var Geir Helljesen.



Tidligere ordfører i Selje kommune, Ottar Nygård, og prosjektleder Randi P. Humborstad

2015

- Møte med prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket (02.02.15)
- Haugesundkonferansen (02. -03.02.15)
- Møte om plan for bruk av tunnelmassene i regi av Selje kommune (10.02.15)
- **Møter med H/FrP-, Ap- og KrF- fraksjonen i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget (19.02.15)**
- Orientering om Stad skipstunnel-prosjektet for Ålesund havnevesen (03.03.15)
- Møte med Brødrene Aa i Hyen (26.03.15)
- Orientering om Stad skipstunnel-prosjektet i Eid kommunestyre (26.03.15)
- **Oppstartsmøte mellom Kystverket og Selje kommune vedrørende reguleringsplanarbeidet for Stad skipstunnel (07.05.15)**
- Intervju med tysk TV i Oslo (RTL Nachtjournal) (29.05.15)
- Møte med Reisemål Stryn og Nordfjord (02.06.15)
- Foredrag om Stad skipstunnel for LO Stat (03.06.15)
- Møte mellom Nordfjord Vekst og Vanylven Utvikling vedrørende ringvirkninger/synergier av Stad skipstunnel (25.06.15).
- Møte med kommunikasjonsavdelingen i Hurtigruten i Tromsø vedrørende bruk av Hurtigruten i markedsføringen av Stad skipstunnel (01.07.15)
- **Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte tunnelinnslaget i Moldefjorden (12.08.15)**
- Møte med Nordfjord Havn om bruk av steinmassene (07.09.15)
- Møte med prosjektleder i Kystverket, Terje Andreassen (30.09.15)
- Folkemøte om Stad skipstunnel i Selje i regi av Kystverket (30.09.15)
- Intervju med Nett.no om nytt magasin (01.10.15)
- **Foredrag om Stad skipstunnel og stand på Transport- og logistikkmesse på Gardermoen (19.-20.10.15)**



Prosjektleder i Kystverket, Terje Andreassen og prosjektleder Randi Humborstad holdt felles foredrag om Stad skipstunnel på Transport & Logistikk 2015.



Styringsgruppemøte 5. november 2015.

5. BESLUTNINGSPUNKT OG OPPFØLGING

5.1. Beslutningspunkt

| | Tidspunkt | Tema | Dokumentasjon |
|------------|-------------|---|--|
| BP# | | | |
| 1 | 13. januar | Møte med statssekretær Reynir Johannesson | Diskutere muligheten for å starte KS2 parallelt med forprosjekt. |
| 2 | Januar | Møte med Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget | Politiske signaler |
| 3 | Vinter 2016 | Møte med reiselivsdirektør Tuftin i Innovasjon Norge | Strategi for turistdestinasjonen Stad skipstunnel |
| 4 | Vår 2016 | Frokostmøte om ringvirkninger av Stad skipstunnel i Oslo | Påvirkning inn mot rullering av NTP'en |
| 5 | Høst 2016 | Bestilling av KS2 | Finansdepartementet |
| 6 | 2016-2017 | Posisjonering i forhold til rullering av Nasjonal transportplan | Rullering av NTP i 2017 |

5.2. Oppfølging

I tillegg til disse beslutningspunktene vil det bli gjennomført møte i styringsgruppen ca. 4 ganger i året. Det vil også bli gjennomført jevnlige møter i prosjektgruppen.

6. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING

| # | Kritiske faktorer | S | K | RF | Mulige tiltak |
|---|--|---|---|----|--|
| 1 | Rollefordeling mellom prosjekteier, styringsgruppe, referansegruppe og prosjektledelse | 3 | 3 | 9 | Klar prosjektplan, vedtatt av styringsgruppen |
| 2 | Samarbeid i en større region | 3 | 4 | 6 | Involvere alle sentrale aktører |
| 3 | Komme i kontakt med sentrale beslutningstakere | 3 | 5 | 10 | Sikre god kontakt med regjering, Storting, NHO, LO og Kystverket. |
| 4 | Samarbeid med næringslivet | 2 | 5 | 10 | Involvere aktører som blir berørte |
| 5 | Markedsføring av prosjektet | 3 | 5 | 10 | Jevnlige presseoppslag, delta på viktige konferanser (eks. Transport- og logistikkmessa) |
| 6 | Finansiering av prosjektet | 3 | 5 | 10 | Sikre god dialog med aktuelle finansieringskilder |

S – Sannsynlighet Hvor sannsynlig vil det være at dette inntreffer. Skala 1- 5 (5 er mest sannsynlig)

K – Kritisk. Hvor kritisk vil dette være hvis det inntreffer. Skala 1-5 (5 er mest kritisk)

*RF – Risikofaktor (S * K). 15 eller høyere vil måtte utløse en aksjon innen en gitt d*

7. ØKONOMI

| Budsjett 2016 | |
|-------------------------------------|----------------|
| Utgifter: | |
| Prosjektledelse/prosjektsekretariat | 400 000 |
| Reisekostnader inkl. konferanse | 100 000 |
| Markedsføring (nettside) | 50 000 |
| Diverse | 50 000 |
| Sum utgifter: | 600 000 |
| Inntekter: | |
| Støtte/bidrag fra: | |
| Møre og Romsdal fylkeskommune | 100 000 |
| Sogn og Fjordane fylkeskommune | 100 000 |
| Hordaland fylkeskommune | 100 000 |
| Havnene | 150 000 |
| Næringsliv | 150 000 |
| Sum inntekter: | 600 000 |

Les mer om Stad skipstunnel på vår nettside: www.skipstunnel.no eller vår Facebook-side: «Realiser Stad skipstunnel»

